

チェックシート(1/3 ページ)

Smart-UPS® RT 14000/18000 の設置作業依頼時にこのチェックシートに記入して APC グローバルサービス宛てにお送りください。(3枚あります) チェックシートには、**全ての UPS の情報を添付**してください。(複数の Smart-UPS® RT がある場合は、システムごとまたは全システムが一括して記載されているものが必要です。また、Smart-UPS® RT 14000/18000 の入力接続方法はハードワイヤ接続(電気工事士有資格者による端子接続)となります。お客様で工事される入出力電源配線系統図を弊社に送付下さい。

送付先：(株) エーピーシージャパン APC グローバルサービス

電話：03-6402-2001(代) FAX：03-6402-2115

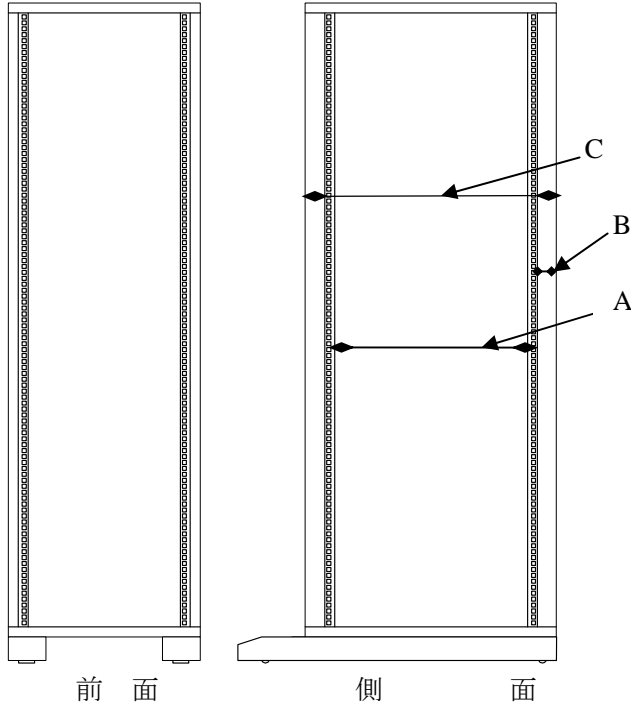
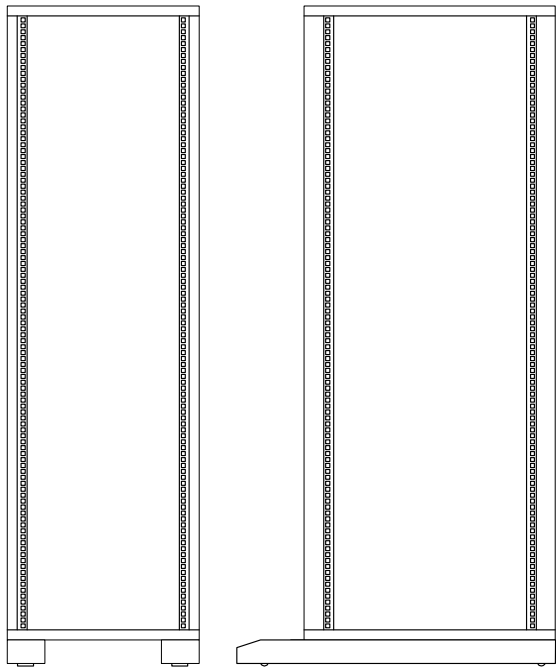
お客様情報

会社名	
ご担当者所属部署名	
ご担当者名	
電話	
FAX	
代理店会社名	
ご担当者所属部署名	
ご担当者名	
電話	
FAX	
電気工事業者名	
ご担当者名	
電話	
電気工事終了日時	年 月 日 時

設置場所の準備

- 設置場所は環境条件(周囲温度、相対湿度)を満たしていますか？
- 設置場所の空調システムは Smart-UPS® RT の発熱量に対して十分な容量を持っていますか？
- 設置場所の床は Smart-UPS® RT の荷重に耐えることができますか？
- 購入する Smart-UPS® RT の構成は、火災予防条例による規制対象(バッテリーパック2台以上)に相当しますか？(バッテリーパックは、最大10台まで接続可能です。) その場合、必要な申請を所轄消防署に行いましたか？
- ラックマウントの場合、搭載するラックの前後のドアは十分な通気出来る形状ですか？(UPSは前面吸気・後面排気です)

チェックシート(3/3 ページ)

1. サイズ 確認 奥行き C の寸法が最低 800mm (推奨 830mm 以上)	
 <p style="text-align: center;">前 面 側 面</p>	Smart-UPS RT 占有 U 数
	<ul style="list-style-type: none"> • Smart-UPS RT14K/18K 本体 12U • Step-Down Transformer : SURT004 3U • 拡張バッテリーパック : SURT192RMXLBP2J 6U
	<p>① ラック のサイズを明記して下さい。 (幅) × (奥行き) × (高さ) (単位 mm)</p> <p style="text-align: center;">mm × mm × mm</p> <p>わかる場合ラックのメーカ、型番を明記してください。 メーカ :</p> <p>型番 :</p>
	<p>② レールの取り付け寸法を明記して下さい (重要 : 左図 A 部の寸法 750mm 以上 910mm 以内)</p> <p style="text-align: center;">mm</p>
	<p>③ ラックの背面からマウントレールまでの寸法を明記して下さい (左図 B 部の寸法)</p> <p style="text-align: center;">mm</p>
2. UPS 設置 位置 確認	
	項 目
	① UPS を設置する位置を 左図に明記して下さい
	② その他サーバー類の位置も明記 して下さい
	③ ラックの背面の空き寸法を明記して 下さい。(保守スペース)
	mm
	<p>(注)UPS 本体と拡張バッテリーパックの搭載位置の間隔を空けて設置することはできません。</p>
